

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称: 生殖中心实验室改造项目

2023 年 10 月

一、项目概况

根据我院实际情况，拟需采购一家符合资质要求的供应商完成我院生殖中心洁净实验室综合改造工程项目。现进行公开调研，欢迎符合资格的供应商参与，供应商可以在调研会议前至少两个工作日提前预约勘察现场（如有需要）。最终在广东省政府采购智慧云平台上完成采购。

二、项目主要内容

序号	采购项目	服务地点	最高限价
1	广东医科大学顺德妇女儿童医院生殖中心实验室改造项目	大良街道保健路3号	43695.83元

三、服务要求

1. 为不影响科室正常运行，要求晚上施工，每天清理现场，材料半成品或成品进场，不允许现场分割，工期2天内完成。

2. 按工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制（如需要）等及国家相关规定执行（详细清单见报价文件第四部分）。

3. 供应商必须要有医院洁净工程经验（提供佐证材料），并在投标材料中附有可行的详细工程施工方案，若中标，应参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1周提交正式施工方案、应急方案、检验方案、进度计划以及人员配备资料给采购人审定同意后方可施工。

4. 指派项目负责人为供应商驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由供应商负责的各项事宜。未经采购人同意，供应商不得随意更换驻工地代表。

5. 供应商必须严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

6. 供应商必须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

7. 供应商在施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

8. 工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

9. 工期约定后如因采购人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因供应商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

10. 本工程以平面图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工

及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

11. 双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前 24 小时通知采购人，采购人代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，但工期也不予顺延。

12. 工程竣工后，供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，必要时提供第三方检测报告，证明满足相关技术规定后，方办理验收、移交手续。

13. 自工程移交采购人管理日起计算，修缮工程保修期为 2 年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，采购人应书面通知供应商并约定时间进行修理。


本项目是属于生殖中心洁净实验室内部工程，所需要的工程材料、施工人员、施工方案等必须符合生殖中心洁净实验室相关要求，包括但不限于避免粉尘、震动、VOC 等影响，若招标人有需要，中标供应商因提供相关合格证明或者进行第三方检测。

四、其他：

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 经双方协商一致解除本项目合同的。
- (4) 其他未尽事项另行商谈确定。

五、平面图：

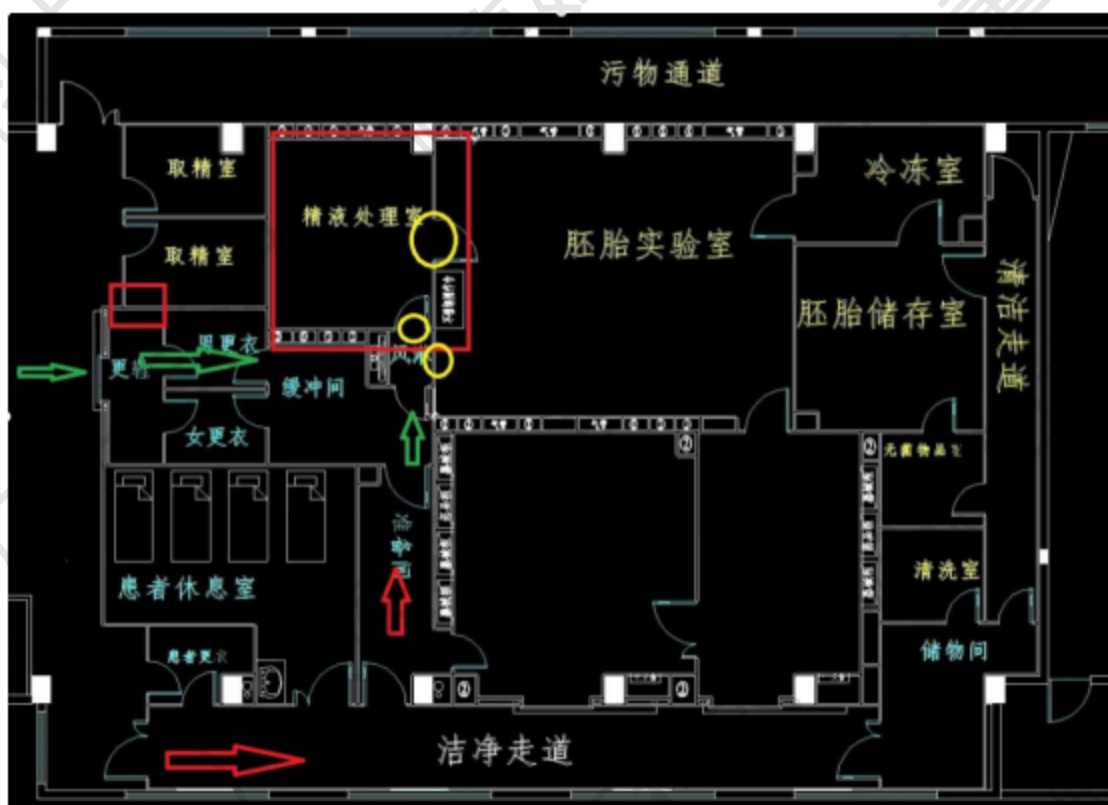

六、评选参考标准：

序号	项目	评分内容	分值
1	服务部分	公司规模、资质等。	10分
		近三年相关业绩情况。	10分

2		公司技术方案比较。	30分
3		公司提供响应时间比较。	15分
4		公司提供售后服务的内容。 (包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较	5分
5	价格部分		30分
